

CHANTIER : HAMEAU DE LA MER 50330 Vicq sur Mer
Commune déléguée de Cosqueville

DATE : Le 11 et 18 Octobre 2021

LIEU : Sur place

COMPTE-RENDU DE CHANTIER

ENTREPRISES	REPRESENTANTS	CONVOQUÉS	PRÉSENTS	DIFFUSION
TPC 06.69.64.35.13	M.LEPOITTEVIN francois.lepoitevin@vinci-construction.fr clement.cauvin@vinci-construction.fr	X	X	X
VEOLIA 02.33.71.60.10	M.PEYROUZERE emmanuel.peyrouzere@veolia.com M. LANGLOIS david.langlois@veolia.com	X X		X X
AUTO BILAN 06.28.71.41.80	M. COSNEFROY – M. LECOURT contact@abr-reseaux.com			X

ADMINISTRATIONS - ÉLUS	REPRÉSENTANTS	INVITÉS	PRÉSENTS	DIFFUSION
Mairie de Vicq Sur Mer 06.13.50.44.67	M. LETERRIER (MAIRE) MME MONTRIEUL M. HAUCHECORNE vicqsurmer.mairie@orange.fr	X	X	X

ADMINISTRATIONS	REPRÉSENTANTS	INVITÉS	PRÉSENTS	DIFFUSION
Communauté d'Agglomération Le Cotentin - Cycle de l'Eau	M. GOASDOUE	X		X

Communauté d'Agglomération Le Cotentin - Cycle de l'Eau	MME REQUIER	X		X
Communauté d'Agglomération Le Cotentin - Cycle de l'Eau	MME. BELAN magalie.belan@lecotentin.fr Tel 02.33.23.01.21	X	X	X
Communauté d'Agglomération Le Cotentin - Cycle de l'Eau	M. HASLEY		X	X
Agence technique départementale	M. LEMOINE marc.lemoine@manche.fr			X
Agence technique départementale	M. MICHEL Jean-louis.michel@manche.fr	X		X
Agence technique départementale 07.85.02.06.83	M. LEPOITTEVIN frederic.lepoittevin@manche.fr	X		X

POUR INFORMATION	REPRESENTANTS	DIFFUSION
Communauté d'Agglomération LE COTENTIN – Directeur du cycle de l'eau	M. BEAUDÉGEL	X
Communauté d'Agglomération LE COTENTIN – Cycle de l'eau - Bureau d'étude	M.MADELEINE	X

OBJET DES TRAVAUX :

DELAIS :

1ère phase : période de préparation
2ème phase : exécution des travaux
3ème phase : revêtements
4ème phase : récolement

60 jours
90 jours

CALENDRIER PREVISIONNEL :

Début Période de préparation : 12/07/2021
Début Pose de canalisation : 20/09//2021
Début Réfection de voirie :
Fin de première tranche :

DELAI CONTRACTUEL :

1ère phase : période de préparation : 60 jours

2ème Phase : Travaux	90jours
3ème phase : revêtements	

ARRET DES TRAVAUX :

- Date d'effet de l'O.S. d'arrêt des travaux
- Date d'effet O.S. de reprise des travaux
- Nombre de jours d'arrêt

PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION :

(Le nombre de jours entre parenthèses comprend les jours calendaires)

	2ème phase	3ème phase
- Pour augmentation masse des travaux		
- Pour difficultés imprévues		
- Arrêts pour intempéries		

DEROULEMENT DE L'OPERATION :

Date d'effet de l'O.S. : 12/07/2021

Fin du délai contractuel : 12/09/2021

Plan qualité remis le : **18/10/2021**

- Date d'effet de l'O.S, 2ème phase	
- Fin du délai prolongé	13/09/2021
- Fin réelle 2ème phase
- Ecart
- Date d'effet de l'O.S. 3ème phase
- Fin du délai contractuel 3ème phase
- Fin du délai prolongé
- Fin réelle 3ème phase
- Ecart

Date d'effet de l'O.S. 4ème phase :

Fin du délai contractuel 4ème phase :

Plan de récolement reçu le :

AVANCEMENT DES TRAVAUX :

		AEP	EP
Tranche 1 et 2 (Impasses)	COLLECTEUR		
	. commencé le	20/09/2021	20/09/2021
	. terminé le		
	BRANCHEMENTS		
	. commencés le	20/09/2021	18/10/2021
	. terminés le		
	REFECTION		

Autocontrôle de l'entreprise

Indice de modification n° :


Rues/Entreprises	a) essais (en laboratoire) sur matériaux de remblai	b) essais de compacité	c) contrôle d'étanchéité sur tronçons	d) contrôle d'étanchéité sur regards de visite et de branchement	e) contrôle des cotes fil d'eau sur regards de visite	f) contrôle des cotes fil d'eau sur tronçon
Avenue de la plage	Minimum contractuel					
	Quantités réalisées par l'entreprise					
	Détail					

OBSERVATIONS DIVERSES

INTITULE	DATES
Périodes de validité des arrêtés de circulation :	N° A2021-024 Du 20/09/21 jusqu'à la fin des travaux
Contrôle de l'affichage des arrêtés de circulation sur le chantier	20/09/2021 (Non affichés Rappel) 22/09/2021 27/09/2021 04/10/2021 12/10/2021 14/10/2021 18/10/2021

Contrôle des engagements environnementaux	
Intempéries	01/10/2021 20/01/2021
Compte rendu Marquage – piquetage	Réalisé le 21/09/2021 impasse puits et lavoir Réalisé le 11/10/2021 parking
Suivi des contrôles extérieurs AUTO BILAN :	
- Envoi des plans	21/09/2021
- Réception du devis	27/09/2021
- bon de commande	06/10/2021
- dates d'interventions	

Les articles numérotés correspondent à des articles nouveaux ou à ceux ayant eu des modifications

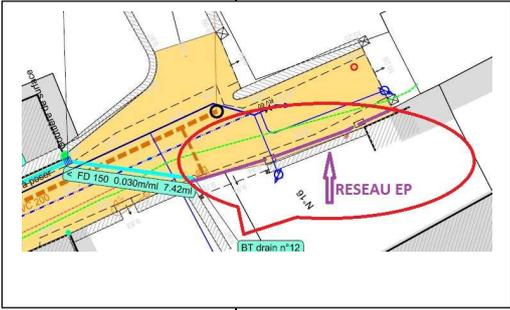N°	OBSERVATIONS GENERALES	ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS CONCERNES	INTERVENTIONS
1	<ul style="list-style-type: none"> • <u>démarrage des travaux, impasse du puits et du lavoir</u> : 20 septembre 2021 installation de la base vie. Sondages en cours de réalisation • <u>Planning</u> : 3 mois de chantier (Or imprévus et intempéries) • <u>Impact circulation</u> : les usagers auront l'accès à leur propriété sauf lorsque l'entreprise sera devant chez eux. Une demande de route barrée par secteur est faite à la commune. L'accès secours est permanent. • <u>Installation de chantier</u> : base vie et matériaux sur parcelle B443 	<p>TPC MAIRE CAC</p>	
2	<ul style="list-style-type: none"> • L'entreprise exécutera les travaux dans les deux impasses en même temps. • La volante sur l'impasse du lavoir est en cour (20.09) • Ouverture des tranchées 21/09 	<p>TPC VEOLIA Mairie CAC</p>	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Un réseau d'eau pluvial non identifié dans l'impasse du puits, a été découvert, la CAC demande à TPC de le reprendre avec la mise en place de deux regards 40*40 tampon fonte, pour une reprise propre dans le cadre de l'aménagement du hameau. 		

4	Des coupures d'eau sont prévues, les usagers seront prévenus par les services de Veolia.	VEOLIA TPC MAIRIE CAC	
5	Au vu des problématiques d'exploitation, une ventouse sera installée dans le carrefour, son implantation sera à définir.	TPC VEOLIA CAC	
6	*En attente du devis des raccordements de VEOLIA * PAQE, Plan EXE.de TPC	VEOLIA TPC CAC	<u>Rappel 27/09</u> <u>Rappel 04/11</u> <u>Rappel 11/10/2021</u> <u>PAQE fournit</u>

➤ Point avancement travaux

Impasse du puits

Le 22/09/21 -> Terrassement et pose de tuyaux D300 18 ml jusqu'au regard EP 40X40 N°2, et du regard 40x40 n°1 jusqu'au BT Drain n°10 + création d'un regard coulé en place 50x50 + création du branchement AEP n°22 (poste de relevage).

Le 23/09/21 -> Terrassement et pose de tuyaux AEP D63 18 ml, utilisation du BRH sur 60cm de hauteur et 5 ml de long.

7 Le 24/09/21 -> Terrassement et pose AEP D63 17 ml utilisation du BRH 5.5 ml sur 60 cm de hauteur et pose de 17 ml de tuyaux D 300 FT.

Impasse Lavoir

Le 23/09/21 et 24/09/21 terrassement de 9 fouilles manuelles pour raccordement des propriétés à la volante, et raccordement par VEOLIA.

Remblaiement fouille de la volante et terrassement pour démarrage de la pose de réseaux le 27/09.

8 Essai pression impasse du puits semaine 40

9 L'implantation des grilles EP a été réalisée par TPC, 27/09

Mr LEPOITTEVIN (département) a validé les points le 29/09 sur place.


- 10
- Essai pression non validé sur l'impasse du puit, dans l'attente de l'intervention de TPC.
 - A suivre analyse LABO, et programmation du raccordement du PVC63 par VEOLIA.
 - Fin de pose de l'AEP sur l'impasse du lavoir.
 - Essai pression impasse du lavoir en semaine 41.



TPC
VEOLIA
CAC

11	<ul style="list-style-type: none"> • Travaux « parking phase 3 » AEP et EP en semaine 41. • Les habitants seront invités par la mairie à aller stationner sur le parking du conservatoire. ➤ La commune fera une information dans les boites aux lettres. <p style="text-align: center;"><u>Avancement</u></p> <p>Terrassement et pose de 18 ml de tuyaux AEP côté puits, pose de 7.5 ml de tuyaux EP à l'entrée de l'impasse du lavoir, d'un regard 40x40 ainsi que de 6 ml de conduite AEP croisement de 9 réseaux.</p> <p>Terrassement et pose de 20 ml de tuyaux EP 250/150 pour raccordement devant le numéro 16, impasse du puits. Réalisation du branchement AEP du n°14, pose de 6 ml de tuyaux PVC D 63 impasse du lavoir, terrassement et réalisation du branchement n°17 et 21.</p>	Mairie TPC VEOLIA CAC	
12	<p>Terrassement des branchements n° 14/16/18, 15 ml de tranchée et 12 ml de tire câble. Pose de 12 ml de 150 FT puis pose de la purge impasse du puits. Terrassement et pose de 24 ml de tuyaux 63 PVC + réalisation branchement n°23 et 25.</p> <p>Création des 5 regards de coulée 50x50 impasse du puits. Terrassement, pose et remblaiement de 24 ml 63 PVC impasse du lavoir et réalisation des branchements n° 29 et 31.</p> <p>Terrassement et pose de 20 ml de 63 PVC impasse du puits et réalisation du branchement n°33.</p> <p>Réalisation du branchement n°35 + fin de conduite AEP jusqu'à la purge.</p> <p>Démolition de 3 citerneaux béton et pose de 3 citerneaux neufs et démolition de dalle béton n°27.</p> <p>Terrassement pose de drain DN 100 entrée impasse du lavoir (23 ml)</p>	Mairie TPC Veolia CAC	
13	<p>Chasse Vauville pose AEP 60 ml DN 40, présence de rocher, reprise des deux branchements AEP, longuement des réseaux souples.</p> <p>Impasse du lavoir, reprise deux branchements AEP, réfection dalle béton au n°27. Essais pression validé le 11/10/21.</p>		

14	<p>Impasse du puits : essais pression validé le 18/10/21, LABEO semaine 43, programmation du raccordement en semaine 44 (le 02/11/2021) dans l'attente des résultats.</p> <p>Reprise des branchements AEP au 18/10 reste trois branchements à reprendre.</p>	<p>Mairie TPC VEOLIA CAC</p>
15	<p>Fin de semaine 42 début 43, sondages dans la rue principale sur EP et AEP.</p>	
16	<p>Modification de réseau EP devant le N° 47 : reprise des trois gouttières raccordées au réseau EP.</p> <p>Un râteau sera installé devant la propriété avec des boîtes de branchements pour les gouttières, pour effectuer une seule traversée en point bas. Le propriétaire a été rencontré.</p>	<p>Mairie TPC CAC</p>
17	<p>Modification du réseau d'EP impasse du puits.</p>	

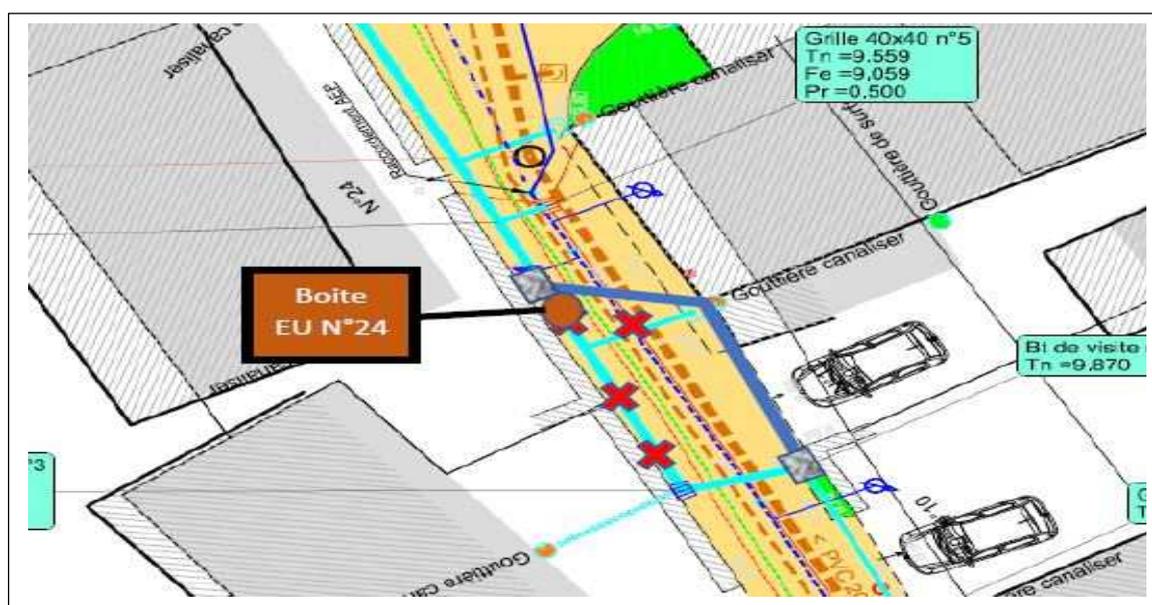

18	<p>Aujourd'hui il a été décidé de ne pas refaire les enrobés sur les tranchées puisque les travaux d'aménagement sont à suivre.</p> <p>La commune revient vers nous après ouverture des plis et rencontre avec le département par rapport au calendrier de leurs travaux afin d'examiner une possible réfection provisoire.</p>	Mairie TPC CAC	
----	---	----------------------	--

PROCHAINE REUNION	
Lundi 25 Octobre 2021 A 14h30 sur place	<p><u>Convoqués</u> : TPC</p> <p><u>Invités</u> : Mairie de VICQ SUR MER</p>

Communauté d'Agglomération Le Cotentin
Chargée de travaux
Mme BELAN



Sans observations écrites sous 8 jours après réception, les termes de ce compte-rendu sont considérés comme acceptés.
